




APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 020/2021

¿QUÉ PASÓ?

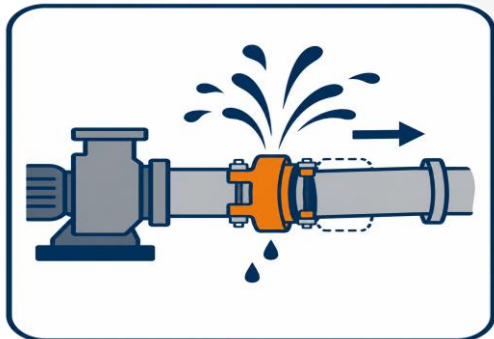

DESPLAZAMIENTO DE UNIÓN VICTAULIC

Puesta en servicio

Durante el proceso de puesta en servicio de la Bomba 324-PP-001, se produce el desplazamiento de una unión victaulic en la línea de descarga, provocando la liberación de fluido. No existía personal expuesto en la línea de fuego y no se registraron daños a personas ni materiales.



Sin Lesión



Planta Concentradora



02.08.2021



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

El procedimiento de montaje y puesta en servicio no establecía una metodología de verificación específica para la correcta instalación de uniones mecánicas antes de energizar el sistema.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la puesta en servicio no incorporó un punto de verificación previo para confirmar el correcto montaje y apriete de las uniones Victaulic antes de presurizar la línea.

CONTROL OPERACIONAL

La línea fue presurizada sin verificar en terreno la correcta instalación y condición de la unión mecánica, permitiendo su desplazamiento durante la puesta en servicio.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ



APRENDIMOS?

Análisis de
aplicabilidad



Procedimiento de instalación de uniones victaulic

Incorporar en el procedimiento de montaje una secuencia de instalación y verificación para uniones Victaulic, definiendo criterios de aceptación antes de la puesta en servicio.

Lista de verificación PRECOM

Incorporar un check list específico previo a la presurización de líneas, verificando instalación, alineamiento, posición de la empaquetadura, componentes de fijación y torque cuando corresponda.

Inspección conjunta previo a energización

Realizar una verificación conjunta entre Construcción, QA/QC y Precomisionamiento antes de autorizar la puesta en servicio de líneas con uniones mecánicas.

Presurización controlada

Establecer una secuencia de presurización gradual con detenciones para inspeccionar visualmente las uniones mecánicas antes de alcanzar la presión de operación.

Control de línea de fuego

Mantener segregada el área durante la puesta en servicio y asegurar que ningún trabajador permanezca expuesto frente a uniones mecánicas o accesorios susceptibles de liberar energía hidráulica durante las pruebas.
