




APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 015/2021

¿QUÉ PASÓ?

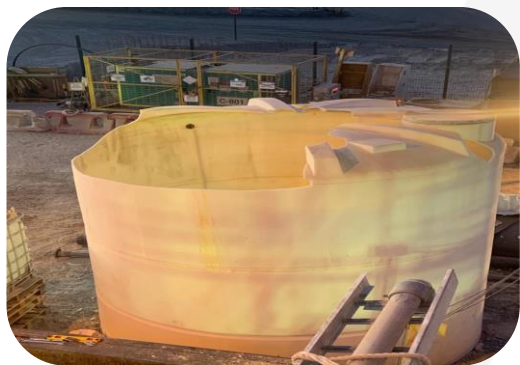

FALLA ESTRUCTURAL DURANTE PREPARACIÓN DE IZAJE

Montaje de TK

Durante actividades previas al izaje de TK, y mientras se tensaban las maniobras con apoyo de camión pluma, la parte superior del estanque cede y se desprende parcialmente del conjunto, sin producir el levantamiento del TK.



Daño Material



Planta Concentradora



22.03.2021



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se establecieron criterios para verificar la condición estructural de equipos o componentes antes de ejecutar maniobras de izaje cuando existían antecedentes de fabricación, uso o almacenamiento que pudieran afectar su integridad.

PLANIFICACIÓN

La planificación del izaje no incorporó una evaluación de la capacidad estructural de los puntos de aplicación de carga ni de los elementos que serían sometidos a esfuerzos durante el tensado inicial de las maniobras.

CONTROL OPERACIONAL

El tensado inicial de las maniobras se ejecutó sin verificar previamente la respuesta estructural del equipo frente a la aplicación progresiva de carga.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ



APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Evaluación estructural previo al izaje

Verificar previamente la condición estructural de equipos, estanques o componentes que serán sometidos a maniobras de izaje, considerando deformaciones, corrosión, reparaciones previas o signos de deterioro.

Procedimiento de izaje específico para equipos especiales

Incorporar en el procedimiento de izaje criterios de inspección estructural y aceptación de equipos antes de aplicar carga mediante grúas o camiones pluma.

Verificación de puntos de aplicación de carga

Confirmar que los puntos donde actuarán las maniobras de izaje sean capaces de resistir los esfuerzos generados durante el tensado y levantamiento.

Tensado controlado de maniobras

Establecer una secuencia de tensado progresivo con detenciones para inspeccionar visualmente el comportamiento estructural del equipo antes de iniciar el levante.

Competencias técnicas para maniobras especiales

Asegurar que supervisores, rigger y personal responsable cuenten con competencias para identificar condiciones estructurales que puedan comprometer la seguridad del izaje antes de autorizar la maniobra.
