
APRENDAMOS de los accidentes GP

F 036/2022

¿QUÉ PASÓ?

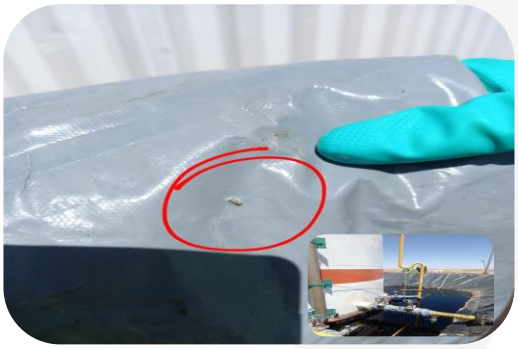

CONTACTO CON ÁCIDO POR DAÑO EN BUZO ANTIÁCIDO

Montaje de equipos mecánicos

Durante el traslado para retirar las maniobras de bomba sumergible instalada en la piscina de contención de estanque de ácido sulfúrico, trabajador tiene contacto con solución ácida. El ácido ingresa a través de un piquete existente en el buzo antiácido, provocando lesión bajo la rodilla derecha.

CTP / LTI | Aglomerado Planta Hidro | 18.02.2022 | Accidente BP

¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No existía un proceso que asegurara la planificación específica de trabajos con exposición a sustancias peligrosas, incorporando la evaluación de accesos, la integridad de los EPP y la preparación para responder ante una emergencia por contacto con ácido.

PLANIFICACIÓN

La metodología de trabajo no consideró las interferencias presentes en la ruta de ingreso y desplazamiento hacia el punto de trabajo, permitiendo que el buzo antiácido pudiera dañarse durante el traslado. Asimismo, no se evaluó adecuadamente el acceso más seguro para ejecutar la actividad.

CONTROL OPERACIONAL

Previo al inicio de la actividad no se verificó la integridad del buzo antiácido después del desplazamiento hacia el punto de trabajo ni se detectó el daño que permitió el ingreso del ácido. Tampoco se implementó una configuración operacional que evitara el ingreso del personal al interior del pretil para retirar las maniobras.

¿QUÉ APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad

Acciones de control / Verifica con tu equipo

Evaluar las rutas de acceso en trabajos con sustancias peligrosas
Antes de ejecutar la actividad, verificar que el recorrido hasta el punto de trabajo no genere riesgo de dañar los elementos de protección personal por contacto con estructuras o interferencias.

Verificar la integridad de los EPP
Inspeccionar visualmente el buzo antiácido, guantes y demás elementos de protección antes y después del desplazamiento al punto de trabajo, retirando inmediatamente cualquier EPP que presente perforaciones, cortes o desgaste.

Eliminar la exposición mediante rediseño de la tarea
Priorizar soluciones de ingeniería que permitan instalar o retirar equipos desde el exterior del pretil o mediante plataformas temporales, evitando el ingreso innecesario del personal al área con presencia de ácido.

Desarrollar procedimientos específicos para trabajos con sustancias peligrosas
Incorporar en el WRAC, ART y procedimiento de trabajo la evaluación de accesos, interferencias, condiciones del EPP, respuesta ante emergencias y controles críticos asociados a sustancias corrosivas.

Capacitar al personal en manejo de sustancias peligrosas
Asegurar que quienes ejecuten actividades con exposición a ácido sulfúrico conozcan las limitaciones del EPP, los criterios de inspección, las acciones frente a daños en la protección y la respuesta inmediata ante contactos accidentales.
